

20180516 NMR 港南中央撤去およびサンプリング作業

立会者：南部方面工事課－尾崎さん、ほか2名

洋光台水道事務所－山口総括

給水維持課－山崎さん、和田

【作業内容】

AM 準備および現地確認

13：00 中村 WP 出発

13：20 現地到着（南部方面工事課、洋光台水道事務所、給水維持課）

NMR 撤去

サンプリング箇所（撤去管継手部分－上下流）切断・受取

撮影、Mアダプター・プラグ取付

14：00 中村 WP 到着

撤去管充水、封入（プラグ、ポリスリーブ）

15：00 片付け等作業完了（NMRおよび撤去管は中村西側倉庫に保管）

【写真】


<現場状況>



<上流側>



内面状況

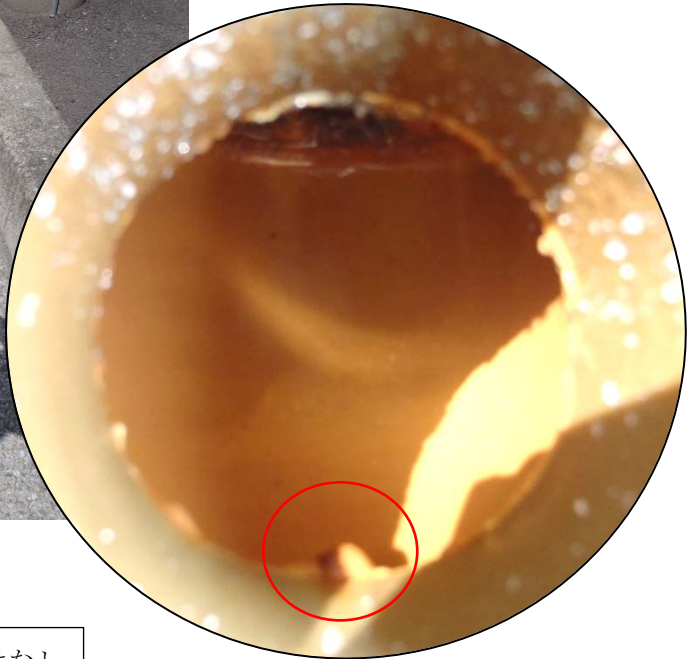

内面状況拡大

接続部分に赤錆が多少発生しているが閉塞等はなし
管内面は健全な状態



撤去管




充水




封入完了

<下流側>

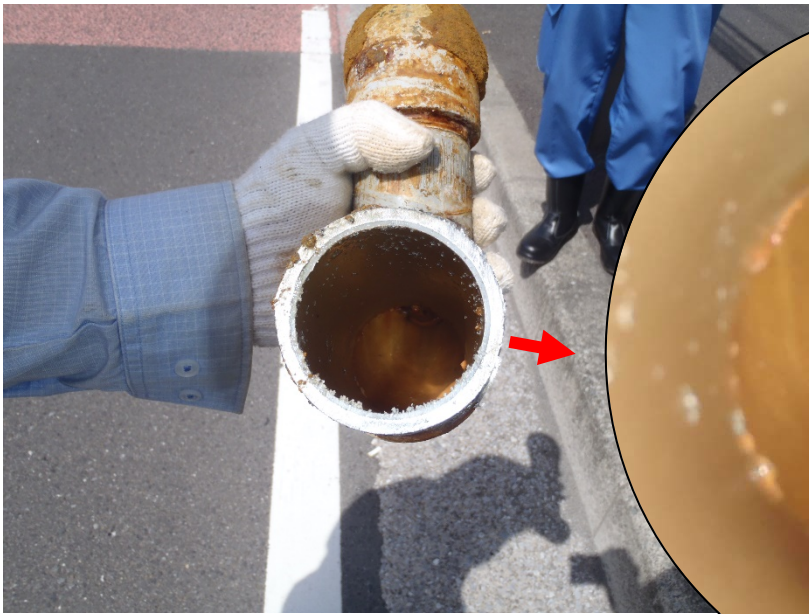

内面状況

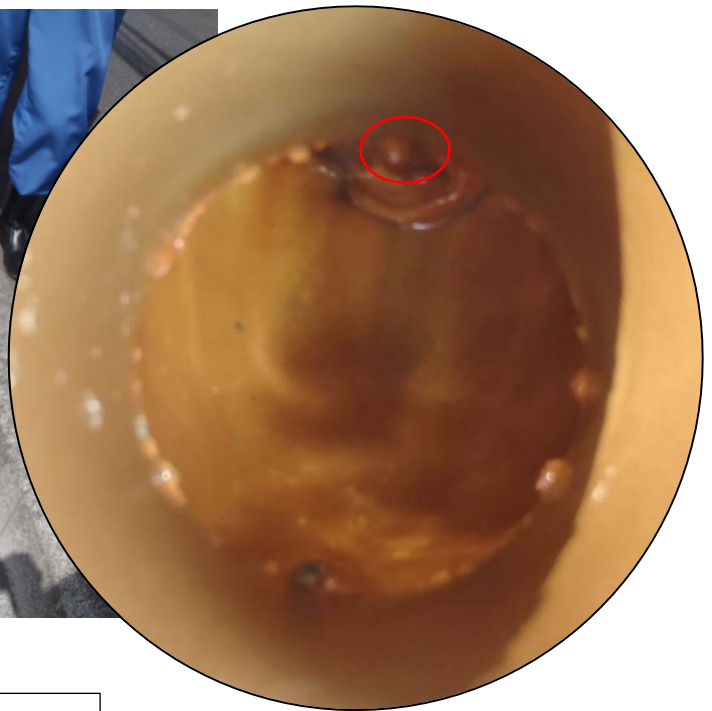

内面状況拡大

上流側同様、接続部分に赤錆が多少発生しているが
閉塞等はなし。管内面は健全な状態
目視では上流側との違いはみられない



撤去管




充水




封入完了

<イメージ>

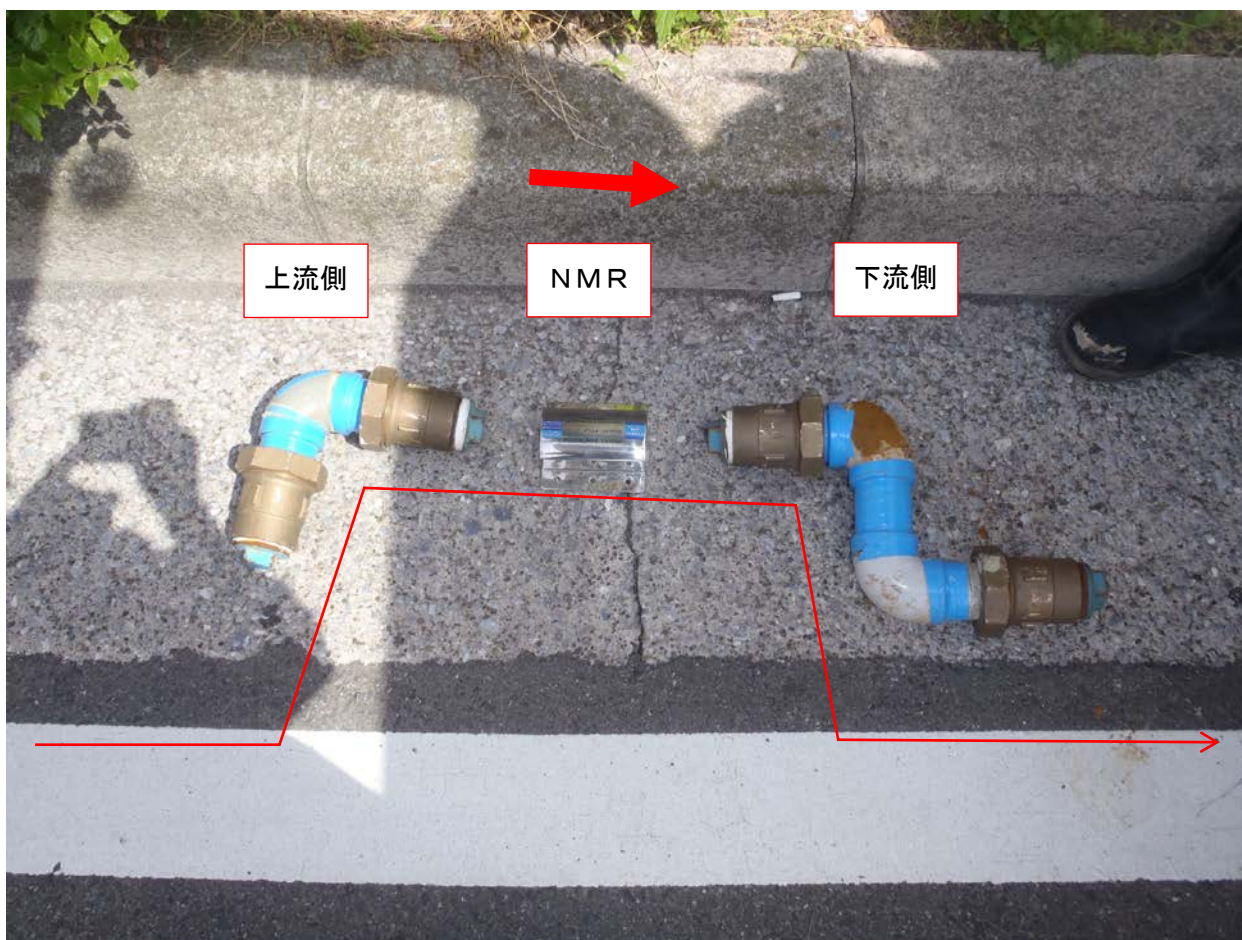

<撤去NMR>

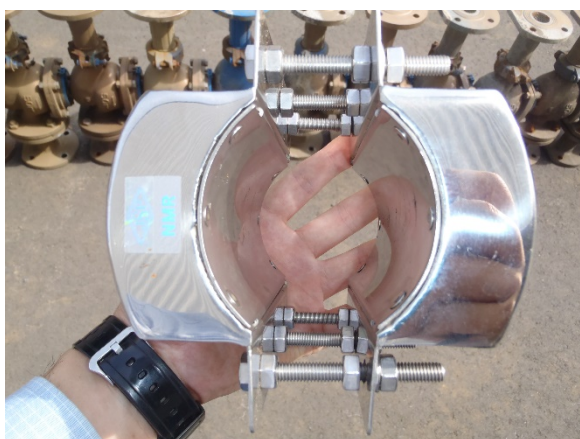

<保管状況（中村西側倉庫）>

